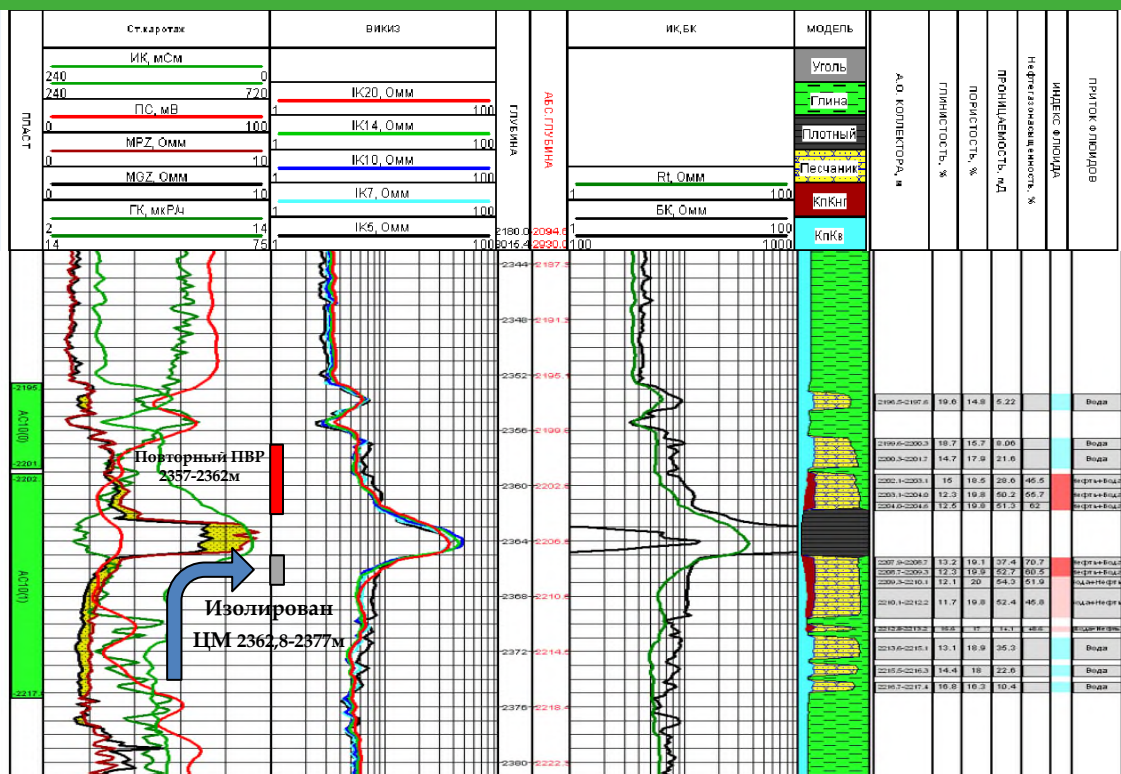
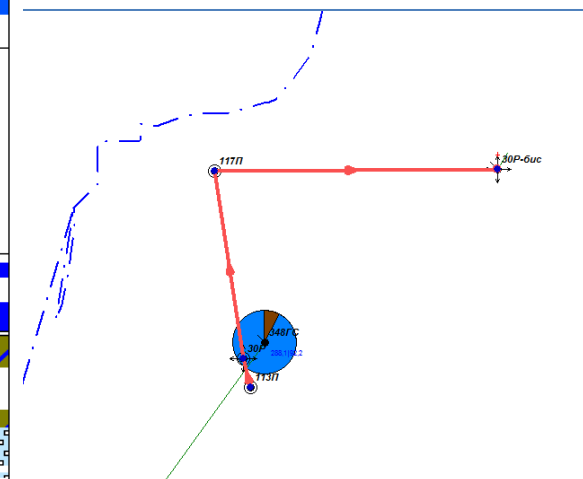
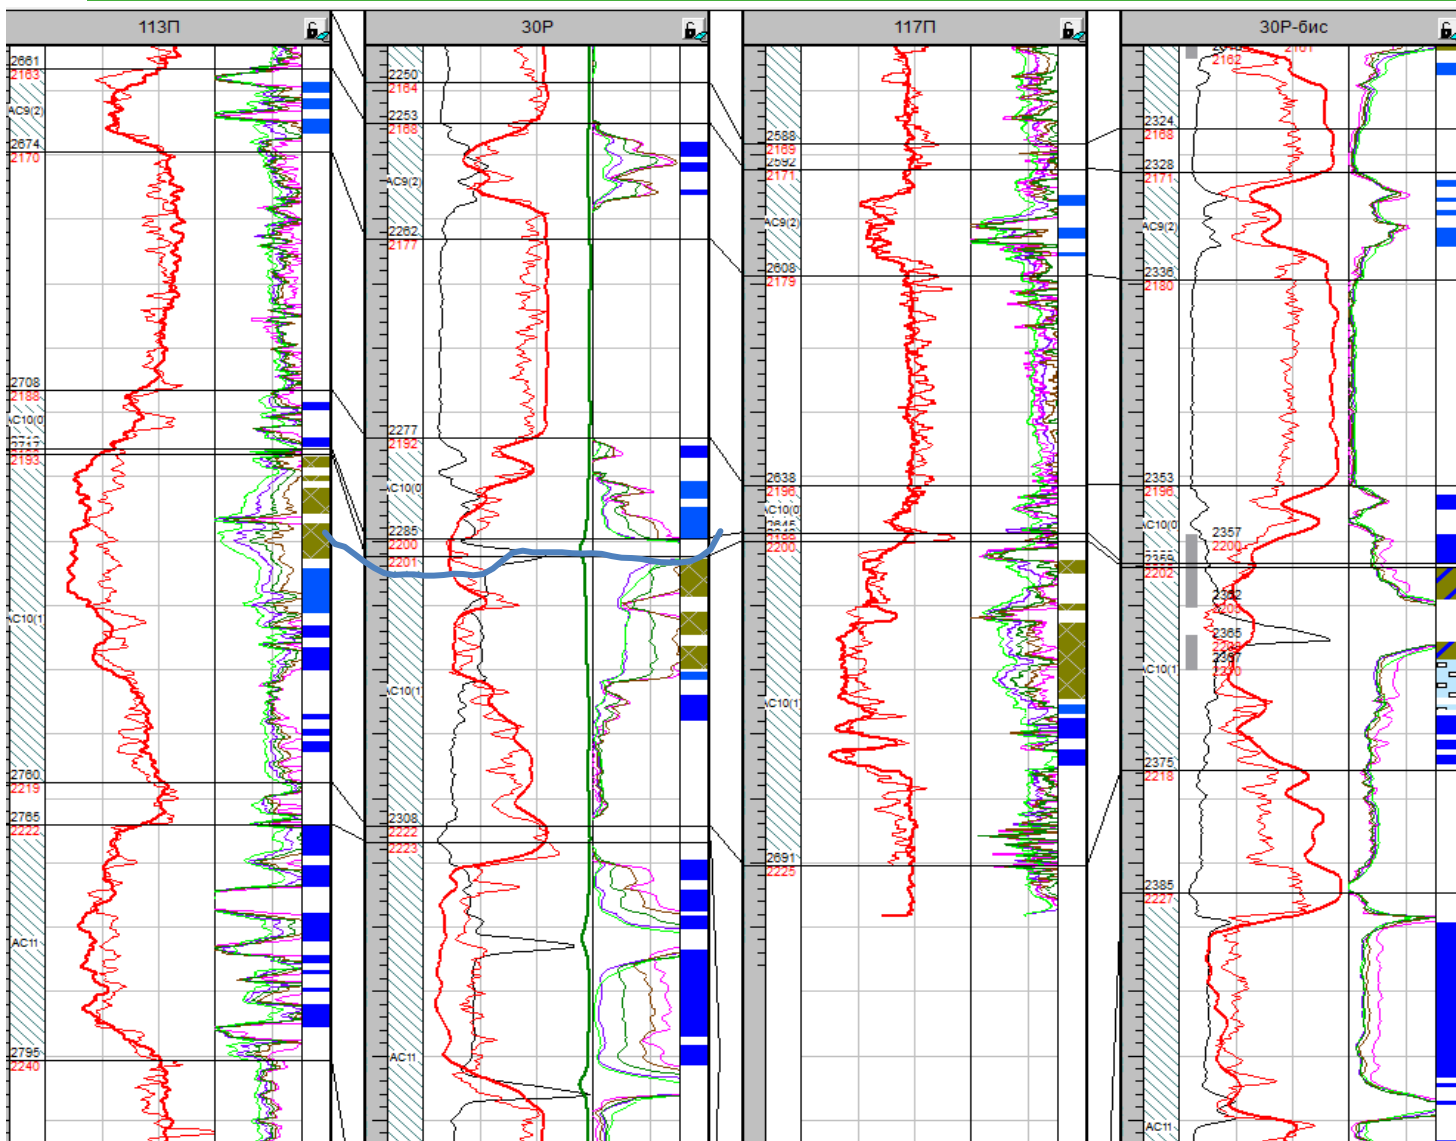

Перевод поглощающей скважины 30Р-бис в добывающий нефтяной фонд
на пласт АС₁₀



По испытании объекта АС₉¹ в боковом стволе № 30Рбис в интервале 2309-2318 м получен приток нефти дебитом 16,8 м³/сут.
12.03.2018 скважина введена в эксплуатацию на пласт АС₉¹ с дебитом 45.7 м³/сут 8%обв 37,6 т/сут
20.05.2018 проведен ГРП 60т по результату ГРП получен прорыв воды, в связи с чем скважина переведена в пьезометрический фонд
12.10.2022 скважина переведена в поглощающий фонд

Схема корреляции по линии скважин 113П-30Р-117П-30Р-бис



КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ № 30Р-бис

